새만금지역 구술조사 및 소장품 수집전략
연구용역 (변경) 과업수행계획서

과업수행계획서

2020. 6. 23

전주대학교 산학협력단

목 차

Ⅰ. 과업개요

1. 과업명
2. 과업목적
3. 과업의 범위
4. 과업기간

Ⅱ. 과업 수행내용

1. 새만금지역 구술조사 및 기록 추진
2. 새만금지역 간척 및 생활자료 카드목록화 추진
3. 간척자료 수집 공모전 추진
4. 사업수행 인력구성 및 업무 분담

Ⅲ. 과업 수행일정

Ⅳ. 과업 예산계획

Ⅰ 과업 개요

1. 과업명 : 새만금지역 구술조사 및 소장품 수집 전략연구 용역

2. 과업목적 및 배경

□ 새만금사업이 가져온 지역사회, 경제, 생업, 생태, 문화 등 급격한 변화상을 구체적으로 보여줄 수 있는 구술 및 생활문화 자료 조사, 기록

□ 특히 '간척'과 관련된 구술자 및 관련 자료 발굴에 집중

□ 수집공모전을 통해 새만금간척박물관의 기증·기탁운동을 활성화하고, 효율적인 자료 수집 및 전시·교육콘텐츠 활용방안 연구

3. 과업의 범위

□ 새만금지역 관련자 대상 구술조사 및 생활자료 조사·기록

○ 새만금지역 마을(주민) 변화상을 확인할 수 있는 주민 대상 구술조사

○ 새만금간척사업 공사현장에 투입된 전문인력 대상 구술조사

○ 새만금지역 주민들의 삶과 관련된 생활사 유물조사 및 카드작성

○ 조사·수집 자료의 보존 및 활용방안 제안

□ 간척 유물 자료 수집공모전 추진 및 수집 전략 연구

○ 공모전 세부 추진계획 수립

○ 접수자료 관리 및 심사·평가 및 수상 자료의 전시 운영

○ 효율적인 자료수집 및 전시·교육 콘텐츠 활용방안 제안

4. 과업기간 : 2020.06.05 ~ 2020.12.31(착수일로부터 7개월 이내)

□ 착수보고회: 착수일로부터 15일 이내

□ 중간보고회: 공모전 전시 개막(11.1) 직전

□ 최종보고회: 과업 종료 14일 이내

Ⅱ 과업 수행내용

1. 새만금지역 구술조사 및 기록 추진

가. 추진 배경

□ 새만금사업이 가져온 지역사회, 생태, 문화 등 급격한 사회변동을 구체적으로 보여줄 수 있는 제보자를 발굴하여 구술조사 및 기록화

□ 일제시기 이후 새만금사업까지 대규모 간척사업과 관련된 주민들, 간척사업관련자 등의 구술조사 기록자료를 확보하여 국립새만금박물관의 전시·소장 자료 확보 및 교육 콘텐츠로 활용

나. 추진 기본 방안

□ 새만금지역 간척관련 참여자 및 주민 대상 구술조사·기록

○ 새만금간척사업에 직접 참여한 인력을 대상으로 새만금간척사업이라는 대역사와 함께한 사람들의 경험과 기억에 대한 구술기록 확보

○ 현지 주민과 사업 전후 이주민 등을 대상으로 그들의 입장에서 바라본 새만금사업 전개과정 및 변화양상 구술조사

○ 엄선된 구술대상자의 구술내용은 영상촬영과 녹취로 남겨, 향후 새만금박물관 전시운영에 아카이브 자료로 활용방안 모색

□ 근·현대기 새만금지역 대규모 간척공사 관련지 주민 구술조사

○ 새만금 간척 이전 시기와 새만금 간척 이후 시기로 구분 대비

○ 새만금간척 이전, 일제시기 주요 간척 사례

- 군산·옥구·김제지역은 일본인 주도, 부안지역은 상대적 한국인
- 위 지역 간척 사례 중 대표적인 지역 선정 후 현지조사 추진

다. 새만금간척사업을 수행한 직간접 대상자 발굴

□ 새만금간척공사를 수행한 관계기관 관련자 구술조사(예시)

○『새만금스토리』(한국농촌연구원, 2011)에 참여자 중 대상자 선정

○『새만금스토리』 수기집은 주제별 집필자 중 선정

○ 새만금사업 관련 용지매입, 어업보상 등 업무 담당자

○ 공구별 참여 기업체, 엔지니어, 중장비 기사, 노동자, 식당 운영자 등

라. 구술조사 과업 목표

□ 주요 정보 제공자 구술조사 · 녹취록 작성 : 50건 추진

2. 새만금지역 간척 및 생활자료 카드 목록화 추진

가. 추진배경

□ 새만금지역의 관련 자료 수집 · 발굴

○ 국립새만금간척박물관 소장품 수집대상을 중심으로 새만금지역 유 · 무형유산 자료 적극 발굴

○ 수집 대상 자료의 목록화와 관련 스토리를 기록하여 정리하고 국립새만금간척박물관에 자료의 기증 · 기탁 의사 여부 등 확보방안 제시

□ 과업대상 지역

○ 군산, 김제, 부안 및 3개 시군 관할 도서지역

- 새만금사업 지역 및 인접지역과 도서지역

○ 김제 광활, 부안 계화, 새만금 등 간척지 사업에 따른 동진강, 만경강, 금강하구 등 새만금지역 간척사업과 연관된 내륙지역

나. 추진 기본 방안

□ 과업대상 시기

○ 근대(개항기) ~ 현재

□ 박물관 전시 및 아카이브 구축에 따른 조사 자료의 기록

○ 국립새만금박물관의 전시 대상 자료 선정 및 주요특징 분석

○ 인터뷰 조사는 녹취록을 작성하여 증거자료로 남김

○ 주요 정보제공자 선정 후 인터뷰 영상기록 제작

○ 자료별 디지털 사진(고해상도) 2~3컷 촬영 및 수록

○ 자료 소재지 분포도 작성(축척 1/5,000지도 및 항공지도)

□ 조사·수집 자료의 보존 및 활용 방안 제안

○ 제도적·정책적 차원에서의 활용

○ 박물관 전시 및 교육콘텐츠 활용

○ 새만금 문화관광 자원으로서의 활용

다. 과업성과 목표

○ 기초목록 작성 수량 : 1,000건

○ 기초목록 중 상세카드작성 목록 수량 : 200건

3. 간척자료 수집공모전 추진

가. 추진배경

□ 2023년 국립새만금간척박물관 개관 자료의 효율적인 수집 및 관리 필요

□ 개인 소장 유물 박물관의 기증·기탁운동 활성화

□ 지역주민들과 밀착된 박물관 위상 확립

나. 추진기본 방향

□ 추진방향

○ 전시대상 자료 우선 확보 및 소멸위기를 고려한 체계적인 접근

○ 효율적인 공모 추진을 위한 체계적인 추진절차 마련

다. 공모전 주요 과업수행 내용

□ 공모대상 선정

○ 부문 : 근현대 간척자료(필요시 수리시설·어로 등 민속자료로 확대)

○ 시기 : 근대(개항기) ~ 현대(필요시 근대 이전 자료 포함)

○ 응모자격 : 새만금지역을 포함한 전국민

○ 수집유형 : 국내·외 간척사업을 증빙할 수 있는 유·무형 자료

□ 수상자료의 전시 및 운영

○ 공모전 시상식 : 2020. 11. 2(월)

○ 전시기간 : 2020. 11. 1 ~ 11. 30(1개월)

○ 전시장소 : 새만금홍보관

○ 전시내용 : 공모전 수상자료 중심

□ 공모전 홍보 계획 수립 및 추진

○ 새만금지역 지자체, 관련기관 홈페이지 등 온라인 홍보

○ 지역방송 유선TV 자막, 지상파 게시판 홍보 등 추진

○ 새만금지역 거점지역별 현수막, 전단지, 포스터 홍보

○ 새만금지역 축제 행사시 홍보부스 설치 등

□ 효율적인 자료 수집 및 전시·교육 콘텐츠 활용방안 제안

○ 공모전 추진의 성과와 개선방안


○ 수집된 자료의 전시 및 교육 콘테츠 활용방안 등

라. 간척 자료 수집공모전 목표 건수


□ 공모전 응모작품 : 100건(100명) 200점

4. 사업수행 인력구성 및 업무 분담

분야	성명	활동경력	주요경력	학위사항
총괄책임	홍성덕	30년	전주대 역사문화콘텐츠학과 교수	전북대 문학박사 (조산후기, 박물관학)
구술조사 (기관, 지역)	김성식	25년	전주대 한국고전학연구소 특별연구원	전북대 문학박사 (민속학)
전시총괄	이정욱	20년	전주대 역사문화콘텐츠학과 교수	츠쿠바대 문학박사 (문화사)
연구검토 유물공모전	설주희	10년	전주대 HK 연구교수	전주대 문학박사 (일제강점기 사회사)
구술조사 유물공모전	이정훈	10년	전북대 무형문화연구원	전북대 문학박사 (구비문학)
구술조사 유물공모전	양지영	12년	전북대 문화인류학과 강사	전북대 박사수료 (문화인류학)
녹취록 현장조사	박선영	10년	전주대 산학협력단	전주대 박사수료 (일제강점기 사회사)
행정, 홍보 유물공모전	최우영	6년	전주대 산학협력단	전주대 석사수료

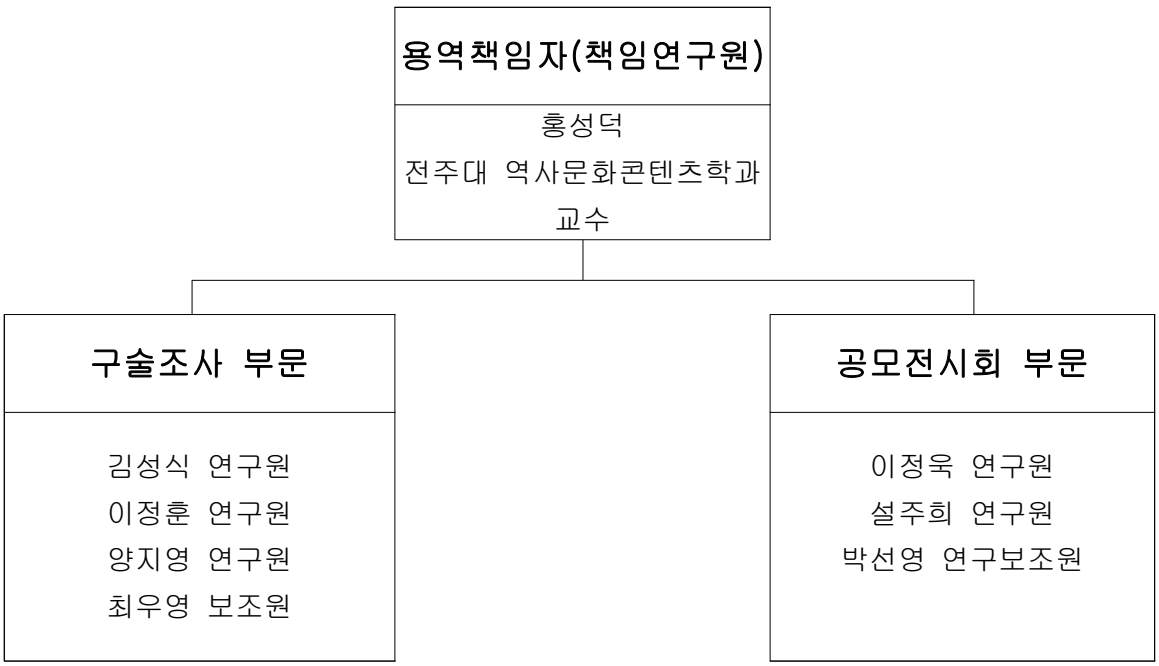

Ⅲ 과업 추진일정

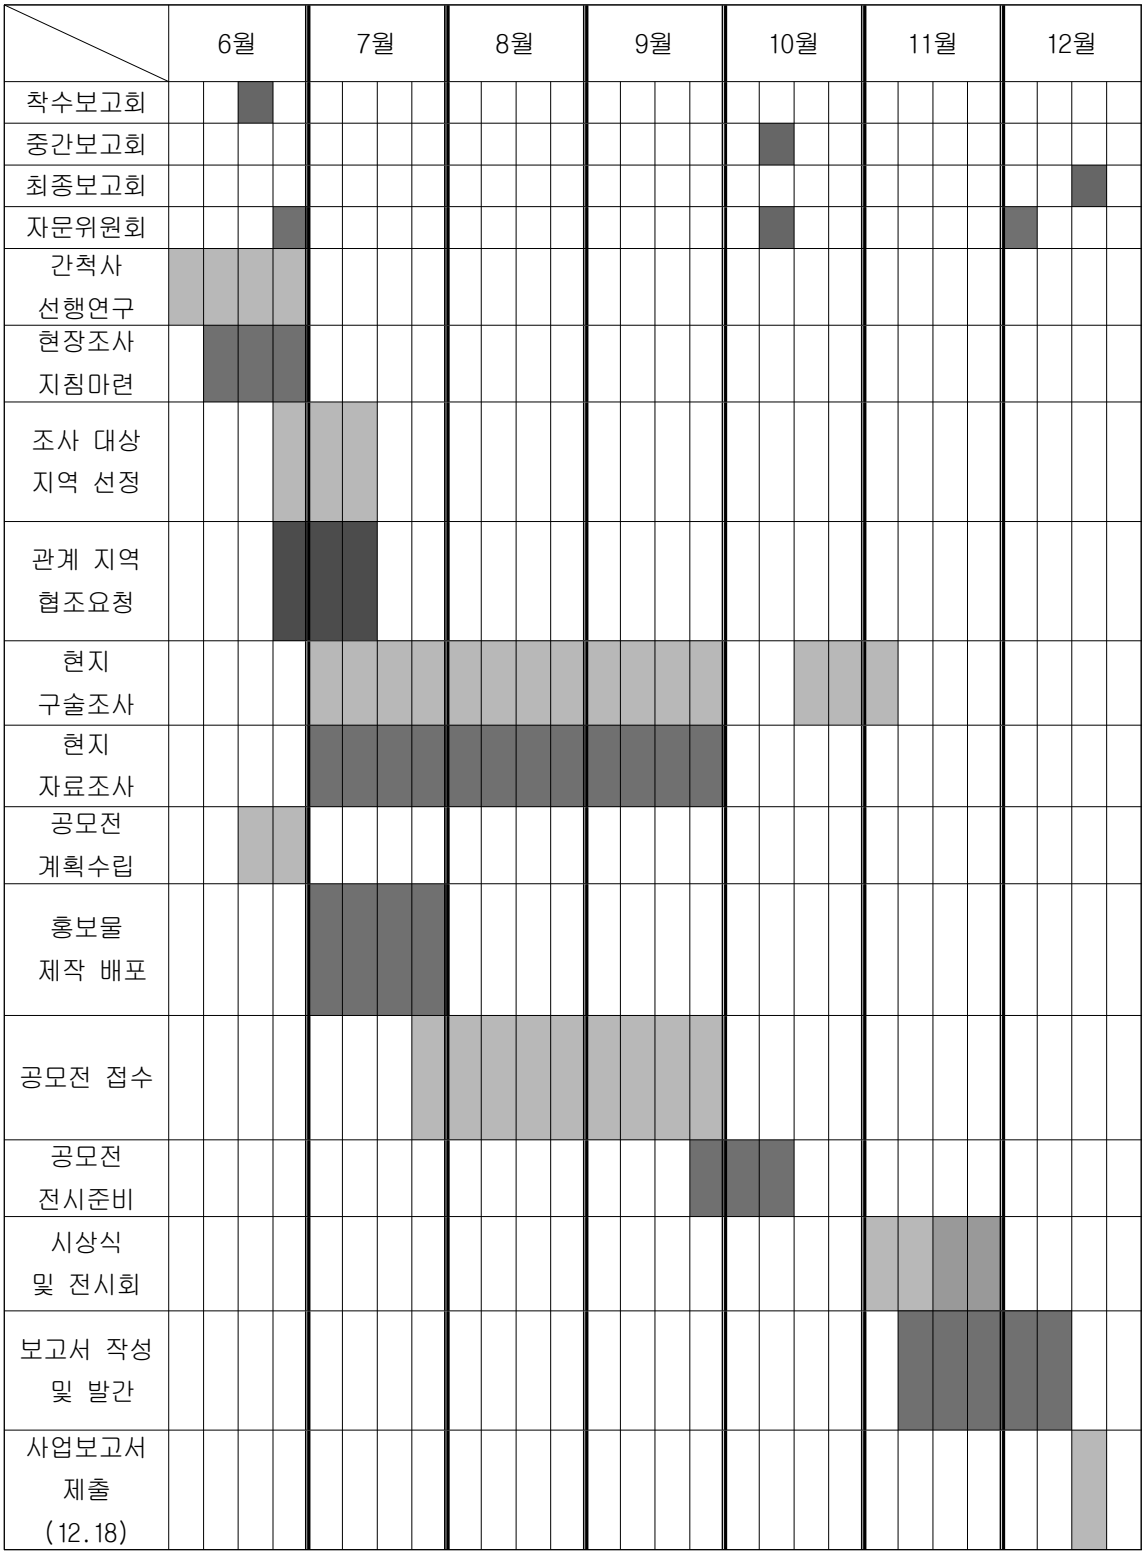
6월
7월
8월
9월
10월
11월
12월
착수보고회
중간보고회
최종보고회
자문위원회
간척사 선행연구
현장조사 지침마련
조사 대상 지역 선정
관계 지역 협조요청
현지 구술조사
현지 자료조사
공모전 계획수립
홍보물 제작 배포
공모전 접수
공모전 전시준비
시상식 및 전시회
보고서 작성 및 발간
사업보고서 제출 (12.18)

Ⅳ 과업 예산계획

(단위; 원)

<table>
<tr><th colspan="2">구 분</th><th colspan="2">금액</th><th>비목별 산출 내역</th></tr>
<tr><td rowspan="8">1.인건비</td><td>구 분</td><td>인</td><td>금액</td><td></td></tr>
<tr><td>책임연구원</td><td>1</td><td>2,100,000</td><td>3,229,730원 × 1명 × 7월 × 10%</td></tr>
<tr><td>연 구 원</td><td>3</td><td>35,000,000</td><td>2,476,514원 × 3명 × 7월 × 68%</td></tr>
<tr><td>연 구 원</td><td>2</td><td>1,400,000</td><td>2,476,514원 × 2명 × 7월 × 5%</td></tr>
<tr><td>연구보조원</td><td>1</td><td>700,000</td><td>1,655,466원 × 1명 × 7월 × 7%</td></tr>
<tr><td>보조원</td><td>1</td><td>3,500,000</td><td>1,236,695원 × 1명 × 7월 × 45%</td></tr>
<tr><td>합 계</td><td>8</td><td>42,700,000</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="10">2.경 비</td><td>홍보비</td><td colspan="2">8,000,000</td><td>TV자막광고 3,000,000 × 1식
포스터 및 현수막 5,000,000 × 1식</td></tr>
<tr><td>회의비</td><td colspan="2">1,500,000</td><td>자문위원회 100,000원 × 3회 × 5회</td></tr>
<tr><td>심사위원회 운영</td><td colspan="2">1,500,000</td><td>150,000원 × 5명 × 2회</td></tr>
<tr><td>시상식개최</td><td colspan="2">1,000,000</td><td>시상식 1회</td></tr>
<tr><td>수상작 전시</td><td colspan="2">4,000,000</td><td>수상작 기획전시 1회</td></tr>
<tr><td>사무용품</td><td colspan="2">800,000</td><td>사무용품 1식</td></tr>
<tr><td>기념품</td><td colspan="2">2,000,000</td><td>현장조사 기념품 5,000원 × 400개</td></tr>
<tr><td>인쇄비</td><td colspan="2">2,500,000</td><td>착수 및 중간보고 700,000
최종보고 1,800,000</td></tr>
<tr><td>합 계</td><td colspan="2">21,300,000</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">3. 시상금</td><td colspan="2">10,000,000</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">4. 일반관리비</td><td colspan="2">4,000,000</td><td>시상금 제외 사업비 6% 이내</td></tr>
<tr><td colspan="2">5. 총 원가</td><td colspan="2">78,000,000</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">6.부가가치세(10%)</td><td colspan="2">7,800,000</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">7. 총 계</td><td colspan="2">85,800,000</td><td></td></tr>
</table>
